

(配布先)

施工担当部署長、建設所長
見積部長、建築技術部長、生産計画部長(建築・土木)
副部長、副所長、統括工事長
設備部長、安全長、安全主任
関西支店取引業者災害防止協議会

事務連絡(安-2019-19)

令和元年 8月1日

関西支店安全総括責任者

副支店長 近江 慎二



【紙回覧】 鉄骨建方中の外部側への飛来落下物防止用 垂直ネット張りについて (指示)

7月26日に関西支店管内の作業所に於いて、鉄骨建方中に建方用
工具を落下させて、近隣の物置の屋根を破損させた事故が発生した。

(物損事故速報を参照)

一步間違えれば、重大な事故・災害へつながる極めて重大な事故で
ある。関西支店では、鉄骨建方中の工具等の落下事故防止については
落下防止ひもで対応してきたが、今回の事故を受けて見直しを指示する。

鉄骨建方計画時(見積時とも)に於いて、敷地外に対する飛来落下事故
防止のため、鉄骨建方中に外部側への先行して垂直ネットを設置するか
しないかの判断は、作業所の統責者判断ではなく、施工担当部署長の
判断によることとする。

また鉄骨建方検討会では、安全環境部・部署の副所長・副部長・安全長
などが、垂直ネット張り手順や安全のポイントを、しっかり確認することも併せ
て指示する。

なお、鉄骨建方中に垂直ネットを張ることは当然コストや工程に影響は
出るが、今回のような事故を決して発生させてはならないという、強い意志
を持って対応するよう、改めて指示する。

以 上

統計外No,36

(工具落下)

部 門 関西支店

部 署 ☐ 部 ☒ 営業所

物 損 事 故 速 報

鉄骨建方中に工具を落として近隣物置屋根を破損

略
称

工事所在地

工 期 2018/2 ～ 2020/2

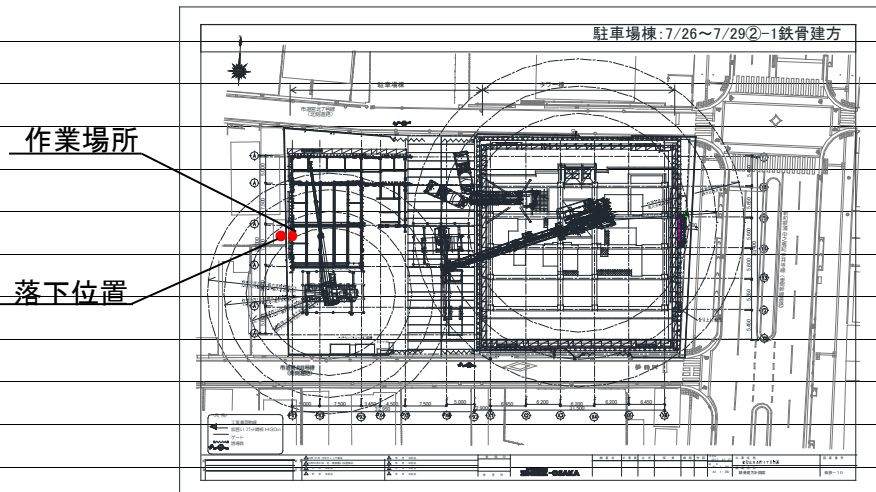
工 事 長

工 事 名 称

請 負 金 億 万円

工 事 長

Tel: (— —) Fax: (—)

発 生 日 時	物 損 事 故 発 生 状 況				
2019年 7 月 26 日(金)	駐車場棟の第3節大梁取付中、仮ボルト締付け用インパクトレンチの落下防止ワイヤーが大梁継手のスプライスプレートに挟まってしまった。建方鳶工が落下防止ワイヤーからインパクトレンチを外して梁の上に置き、落下防止ワイヤーをスプライスプレートからはずしている時、インパクトレンチに体が接触したため、インパクトレンチを落下させてしまい、近隣家屋の外部にある物置屋根部に当たり、プラスチック製の波板等を破損させた。				
☒ 午前 ☐ 午後 9 時 50 分 頃					
物 損 名	近隣の物置屋根破損				
物損事故起因会社名	兼喜会 ☐ 会員 ☐ 非会員 災防協 ☐ 加入 ☐ 未加入 互助会 ☐ 加入 ☐ 未加入				
起因会社名 (2 次)					
職種(鳶 工)					
工 程 進 捗 状 況	発注者名	JV状況	■ その他の記事		
現在の主工事					
1、16軸17床躯体中 1F~12F仕上					
2、駐車場棟;鉄骨工事	会 長	社 長	副 社 長	本 部 長	安全環境本部 (月 日)
全体工期進捗 — 53 %					部署印座

事故発生日時は
垂直ネットは
なかった。

