

事務連絡(安-2020-09)  
2020年4月27日

(配布先)

施工担当部署長、建設所長  
副部長、副所長、統括工事長  
設備部長、安全長・安全主任  
S・BLC関西支社  
関西支店取引業者災害防止協議会

関西支店  
安全環境部長



### 【紙回覧】 解体工事中の災害防止について(指示)

安全環境本部安全部長より指示がありましたので連絡します。

他支店の解体作業所にて、小梁の溶断作業中にスラブ(6.55m×10.45m, 厚さ165mm)が崩落し、溶断作業を行っていた作業員が4.5m墜落するという災害が発生しました(別紙参照)。

関西支店においても今年度解体工事が多く、同種関連災害を起こさないために別紙安全環境本部部長指示を徹底するようにしてください。

以 上

(配布先)  
部門安全環境部長

事務連絡 20-09  
令和2年4月17日

安全環境本部  
安全部長 

### 解体工事中の災害防止について（指示）

今週、当社の建物解体工事作業所で、小梁の溶断作業中にスラブ（6.55m×10.45m、厚さ165mm）が崩落し、溶断作業を行っていた作業員が4.5m墜落するという災害が発生しました（別紙参照）。幸いにも安全带及び安全ブロックを装着していたので、直下の1階床面（約8m下）に墜落することなく、落下速度も緩和された形でコンクリートがら上に着地したため、重篤な災害にはならなかったものの、当初の解体手順が守られずにスラブが崩落し、墜落災害が発生したことは大いに反省しなければなりません。

解体工事においては、解体する構造物に不確定要素が存在する可能性があるため、解体手順を誤ると第三者を巻き込む公衆災害につながりかねません。つきましては、解体工事中の災害防止のため、下記事項を作業所関係者に徹底させるよう指示します。

### 記




1. 工事着手前に行う関係者（部署、技術・安全スタッフ、取引業者職長等）全員による検討会で施工計画の安全性を確認するとともに、検討会で決められた解体手順を厳守させること。
2. やむを得ず解体手順を変更する場合は、計画書や計算書の見直しを行い、再度検討会を実施して変更後の手順が安全であることを確認すること。また、取引業者独断での手順変更がないよう連絡調整・現場巡視を確実に行うこと。

以上

(別紙)

(デッキスラブ 崩壊と墜落) 建物の解体中、3Fデッキスラブが崩壊し解体工が墜落した

◇発生日時：2020年4月14日(火) 午前10:55頃

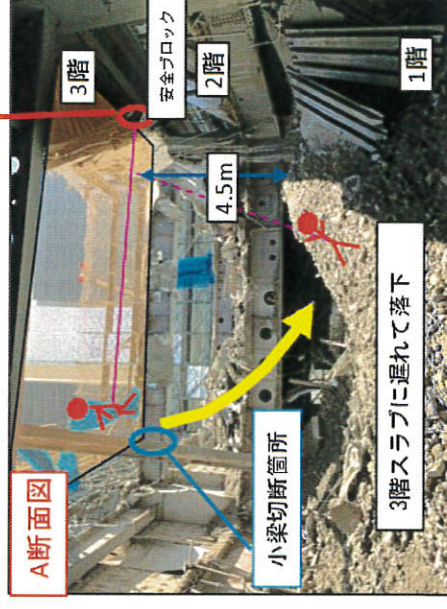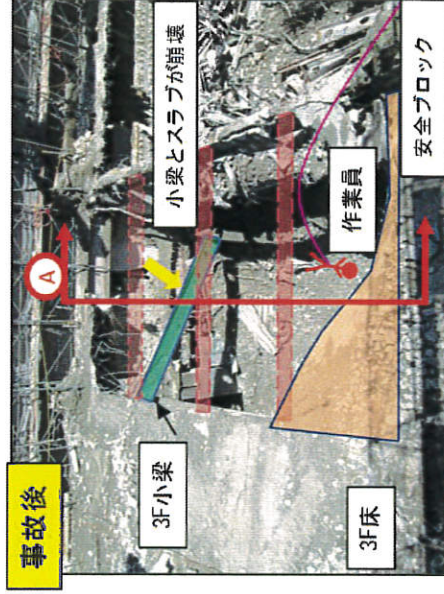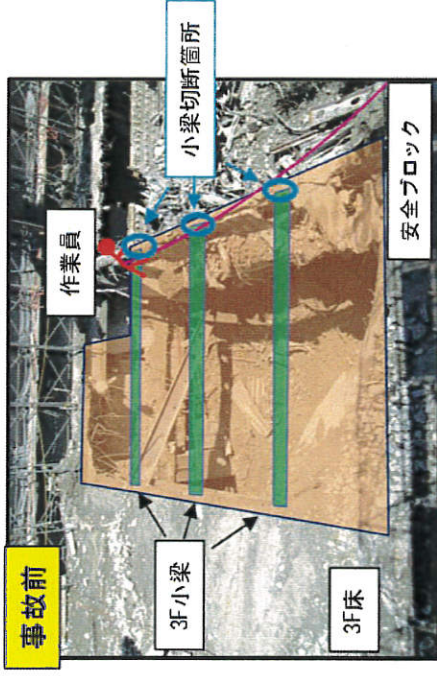

【発生状況】

3Fスラブを解体する際、3F小梁(3本)の端部(6箇所)を溶断作業中に3Fスラブが小梁(3本)と一緒に崩落し、溶断作業中の作業員が足場を失い墜落した(約4.5m)。
