

令和3年8月19日

（配布先）

支店長・副支店長
施工担当部署長、建設所長
副部長、副所長、統括工事長
安全長・安全主任
工事長・工事主任
関西支店取引業者災害防止協議会

関 西 支 店
安全環境部長

車両系建設機械による物の飛散事故防止について（要請）

過日、他支店の医療施設の新築工事において、既存建物隣接部分埋戻し作業で土を運搬中の0.45m³バックホウのキャタピラが、敷き鉄板上の石（こぶし大）を弾き飛ばし、隣接建物リハビリテーション室の窓ガラスを破損するという物損事故が発生しました。幸い人的被害はありませんでしたが、ケガ人が出ても不思議ではない事案です。（別紙-1 参照）

当社では、昨年も、重機のキャタピラで飛散した物による休業災害が発生しており（別紙-2参照）、同種災害・事故の再発防止のため、下記のとおり安全衛生管理標準を一部改訂することとしたので、作業所関係者に周知徹底するよう要請します。


記

1. 『安全衛生管理標準 第2編 第2章 第6節 車両系建設機械』に、「敷鉄板等の走行路上に飛散するものがないことを確認する。」を追記
2. 『安全衛生管理標準 第5編 第2章 第9節 車両系建設機械』のチェックリストの項目に、「敷鉄板等の走行路上に飛散するものがないか」を追記
3. 改訂日は、令和3年9月1日

以 上

(物損) 敷き鉄板上の石が飛んで既存建物の窓ガラスを破損した

◇ 発生日時：2021年7月28日（水）午前11:50分頃

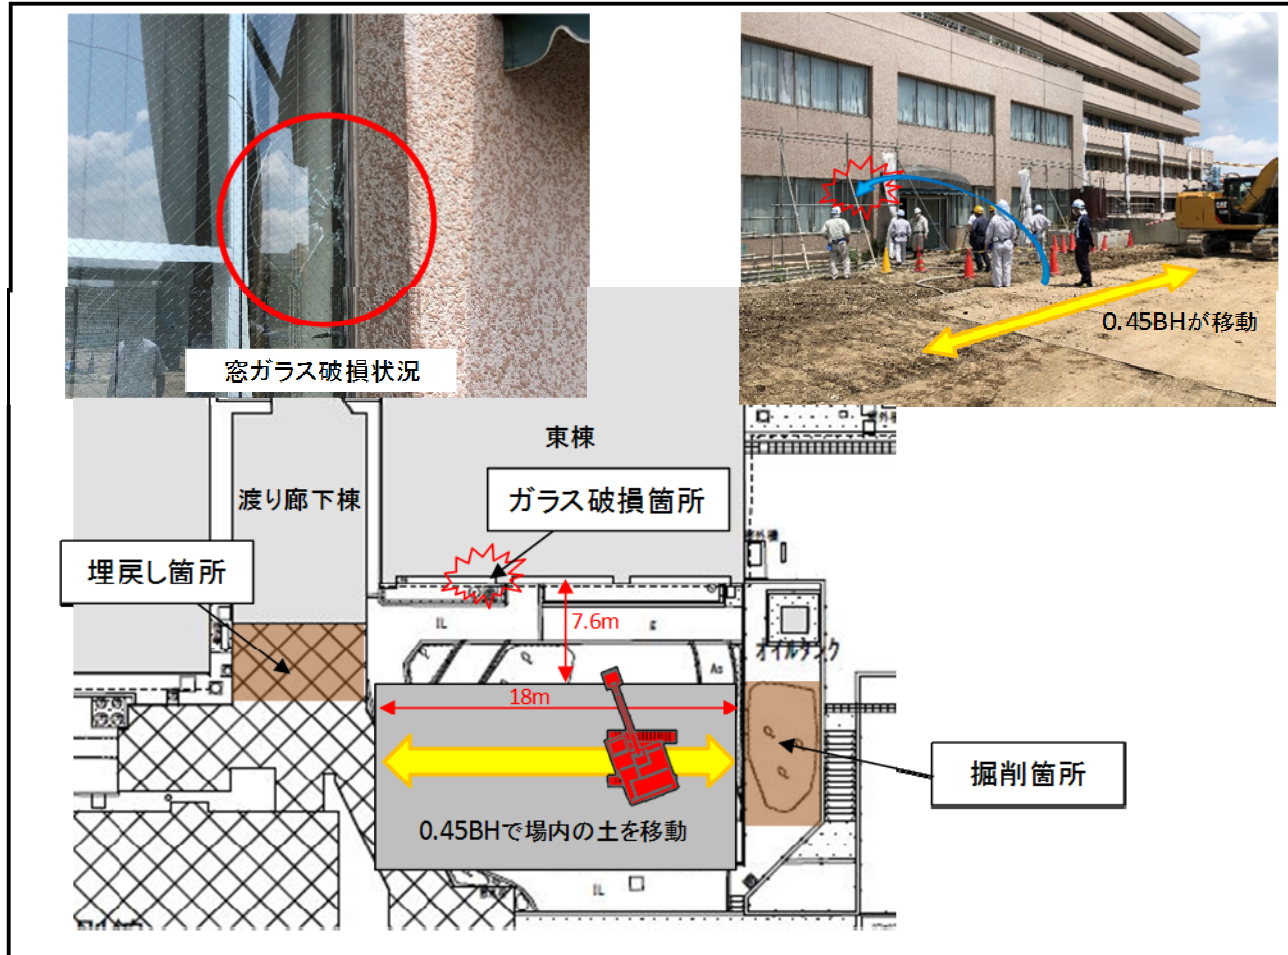

【発生状況】

既存建物の東棟1階の南側で、東棟に隣接する渡り廊下棟前の埋戻し作業を、0.45 m^3 バックホウを使用し掘削箇所との間を移動しながら行っていた。得意先の要望により、リハビリテーション室の明るさを確保するため防災シート養生を外していたところ、敷き鉄板上の石(こぶし大)がキャタピラで弾き飛ばされ、リハビリテーション室の窓ガラスが割れた。

(飛来・落下) 重機誘導作業中に、鉄クサビが飛来し足に当たる

◇発生日時:2020年8月18日(火) 午前11時25分頃

◇被災者:建造物解体工 31歳(所属3次) 経験10年



【発生状況】

重機誘導作業中に、クローラーのキャタピラーで踏まれて跳ねたケーシング固定用の鉄クサビ(重量:約3kg)が、右足の脛に当たった。(右脛骨骨幹部開放骨折)(休業見込日数 90日)
